



RINCÓN DE ROMOS
H. Ayuntamiento 2019-2021

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

NO. DE OFICIO: 641/2021

ASUNTO: Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021

Rincón de Romos, Ags., 06 octubre del 2021

DIP. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

Conforme al Lineamiento Técnico para la Integración del Informe Mensual y para la Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes tercera sección del 11 de noviembre de 2013, remito a usted de manera impresa y digital el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021, del Municipio, así como del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

En espera de su aprobación y para los fines que juzgue convenientes, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



OSFAGS
ORGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACION

RECIBIDO
13 OCT. 2021

HORA: 2:11 SA

ATENTAMENTE

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
LXVI LEGISLATURA
DIP. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
SÍNDICA MUNICIPAL

Presidencia Municipal
Rincón de Romos, Ags.

13 OCT. 2021

FIRMA


C.C.P. Lic. Francisco Martín Muñoz Castillo. - Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes
Lic. Ma. Del Rosario Díaz Alemán. - Titular del Órgano Interno de Control.
L.C. Clara Torres Reyes. - Tesorera Municipal

Presidencia Municipal

FIDELITAS

Hidalgo No. 20 C. Histórico | Rincón de Romos, Ags.

(465)95-104-13 y (465) 95-104-03 Ext. 1504

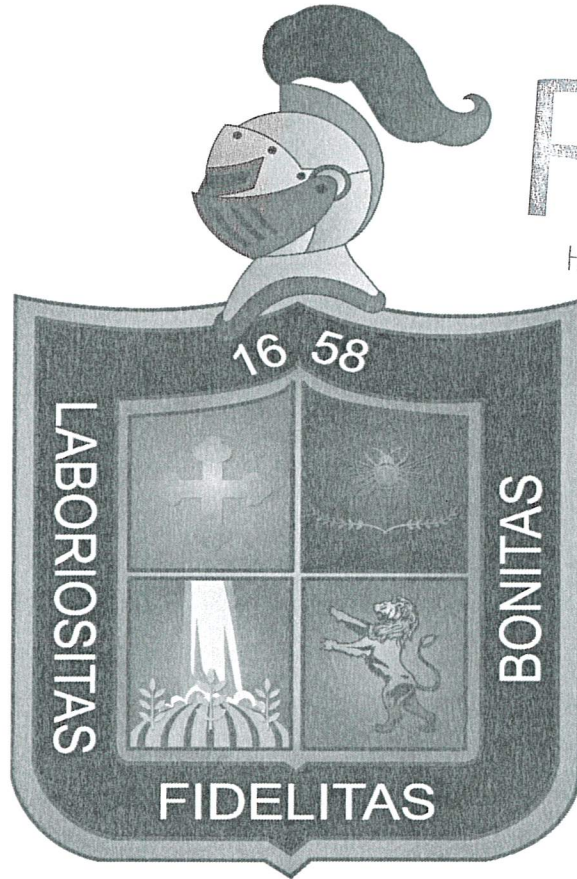


OSFAGS
ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN

R 13 OCT. 2021 **O**
HORA: 2:11 SA

RINCÓN DE ROMOS

H. Ayuntamiento 2019-2021

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2021



INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 3
FRACCIÓN XIII, 55Y56 DE LA LEY DE
TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SUS MUNICIPIOS.

ANEXO 11

Handwritten signature

Clave: Entes Escalafón

Municipio de Encino de Bonos
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021

CLAVE	NOMBRE	Julio			Agosto			Septiembre			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
4111	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	432	1.687	25.6%	1.687	13.194	162,3%	24.129	5.000	483%	30.096	15.000	201%	4.897.500	134%	
4112	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	111.033	595.833	18,6%	595.833	238.368	41,6%	1.093.214	1.025.000	107%	6.496.227	4.897.500	73%	1.665.000	125%	
4117	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LA RENDIMIENTO	517.143	325.000	62,6%	325.000	208.333	64,1%	409.211	805.000	25%	2.147.876	1.665.000	123%	2.282.548	151%	
4119	ACCESORIOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	144.901	208.333	74,3%	208.333	148.828	71,4%	338.744	1.344.304	25%	2.282.548	1.665.000	123%	2.282.548	151%	
4120	ACCESORIOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	101.860	448.101	44,0%	448.101	121.972	27,2%	448.101	7.500	0%	22.500	22.500	100%	22.500	0%	
4141	DERECHOS POR EL USO DE SERVICIOS PÚBLICOS	194.310	2.900	6,7%	2.900	208.333	0,1%	598.724	7.500	0%	1.497.915	1.125.000	133%	6.590.335	127%	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	952.086	683.943	71,9%	683.943	448.845	65,6%	1.149.230	2.951.825	26%	4.897.500	3.950.000	101%	4.897.500	123%	
4144	OTROS DERECHOS	173.491	571.667	33,8%	571.667	448.845	78,7%	1.149.230	1.149.230	100%	1.149.230	1.149.230	100%	1.149.230	100%	
4145	ACCESORIOS DE DERECHOS	31.745	20.833	65,8%	20.833	39.194	188%	103.509	62.500	60%	38.868	187.500	20%	187.500	20%	
4149	DERECHOS NO COMPRENDIDOS DE INGRESOS	102.125	20.833	20,4%	20.833	24.433	120%	320.073	126.515	253%	652.270	376.515	175%	15.000	0%	
4150	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	188.178	949.553	50,4%	949.553	1.667	0,0%	3.950.002	5.000	0%	4.897.453	15.000	0%	15.000	0%	
4162	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	-2.866.000	0	0%	0	1.667	0,0%	2.866.000	5.000	0%	0	0	0%	0	0%	
4163	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0	1.667	100%	1.667	0	0%	0	5.000	0%	0	0	0%	0	0%	
4169	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS	0	8.333	0%	8.333	2.241	26,9%	2.241	25.000	0%	2.241	75.000	0%	75.000	0%	
4300	DERECHOS DE PARTICIPACIÓN COO PAGO	0	9.004.417	0%	9.004.417	8.598.756	95,5%	37.841.161	37.813.250	0%	85.163.000	61.939.750	107%	61.939.750	107%	
4281	PARTICIPACIONES	6.958.450	6.023.523	86,6%	6.023.523	6.995.453	101%	20.986.353	18.070.570	116%	66.959.055	57.949.076	105%	57.949.076	105%	
4213	CONVENIOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	
4284	INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL	425.860	467.225	109%	467.225	427.641	100%	1.329.352	1.401.675	0%	4.312.995	4.305.025	103%	4.305.025	103%	
TOTAL		16.166.181	19.892.246	123,6%	19.892.246	18.474.389	92,9%	57.930.586	59.676.737	97,1%	189.329.663	170.345.667	111,1%	170.345.667	111,1%	

CLAVE	NOMBRE	Julio			Agosto			Septiembre			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA TRIMESTRAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	8.056.344	9.515.755	84,7%	9.515.755	12.504.379	120%	29.888.919	29.547.264	101,2%	80.923.397.33	84.291.114	96,0%	84.291.114	96,0%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.479.520	2.463.862	60,1%	2.463.862	1.469.226	59,6%	4.563.300	7.391.645	62,0%	18.695.639.76	18.572.645	100,2%	18.572.645	100,2%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1.245.544	1.789.028	70,2%	1.789.028	2.237.378	125%	5.459.760	5.987.085	91,2%	14.890.868.72	15.467.735	96,0%	15.467.735	96,0%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.247.416	2.521.960	49,5%	2.521.960	2.455.124	96,2%	5.544.009	7.565.880	73,3%	10.111.287.22	15.541.230	103,7%	15.541.230	103,7%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26.850	752.849	3,6%	752.849	19.418	2,6%	2.508.848	2.508.848	100%	407.832.32	2.663.848	18,3%	2.663.848	18,3%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1.342.860	3.260.954	41,2%	3.260.954	6.643.782	204%	12.404.923	9.782.861	126,8%	12.464.965.06	33.213.361	37,5%	33.213.361	37,5%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	148.238	0%	148.238	18.600	12,6%	18.600	444.713	4,2%	266.550.00	597.213	45,4%	597.213	45,4%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	560.519	0%	560.519	0	0%	0	1.081.558	0%	0	18.442	0%	18.442	0%	
TOTAL		14.261.544	19.892.246	139,4%	19.892.246	25.343.909	127,4%	61.143.288	59.676.737	97,4%	143.721.570	170.345.667	84,4%	170.345.667	84,4%	

[Handwritten signature]

LIC. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. LAURA FERRINDE CÁSTORENA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L. C. ROSA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL



Informe de Avance de Gestión Financiera
Municipio de Romeros
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF- TICAD

CLAVE	PROGRAMA NOMBRE	Julio			Agosto			Septiembre			ACUMULADO EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA			
01	Campañas y rutas de ciclismo	0	22,162	0	22,162	20,986	0	20,986	0	68,485	0%	0%	
02	Ligas deportivas	0	833	0	833	0	0	0	0	2,500	0%	0%	
03	Ligas deportivas	0	2,500	0	2,500	10,154	5,400	10,154	0	7,500	215.4%	79.6%	
04	Divulgación cultural y artístico	688,248	611,323	595,018	611,323	1,982,085	1,833,970	1,833,970	1,833,970	5,458,074	109.4%	109.4%	
07	Diagnóstico de servicios y Atención a la salud	0	8,333	0	8,333	0	0	0	0	25,000	0%	0%	
08	Función del Municipio	0	18,423	0	18,423	432,423	432,423	432,423	432,423	59,637	0%	0%	
09	Atención a grupos en situación de vulnerabilidad	499,595	432,423	432,423	432,423	560,722	1,497,641	1,497,641	1,497,641	3,759,693	100.4%	100.4%	
10	Bienestar de la persona y de la familia	186,738	184,886	208,425	184,886	160,572	184,886	584,724	1,169,893	1,169,893	100.4%	100.4%	
12	Día de la familia	0	1,786	0	1,786	0	0	0	0	92,857	0%	0%	
14	Cara Navidad	0	12,500	23,876	0	148,156	148,156	148,156	148,156	37,500	396.1%	131.7%	
15	Talleres	19,800	22,500	18,800	18,800	36,800	36,800	74,600	74,600	162,750	109.8%	114.2%	
17	Salud Pública	133,320	112,645	121,224	112,645	94,457	94,457	340,349	340,349	1,647,334	113.7%	111.6%	
18	Atención y participación ciudadana	456,521	423,310	253,693	423,310	355,085	1,269,929	1,269,929	1,269,929	3,508,489	84.0%	82.4%	
19	Participación y Atención ciudadana	369,691	479,166	367,310	479,166	479,757	479,757	1,207,668	1,207,668	4,259,215	82.4%	82.4%	
20	Deporte joven	3,000	3,667	2,162	3,667	9,000	9,000	14,162	14,162	394,237	85.3%	85.3%	
21	Dinamización del deporte	32,062	2,485	31,354	30,496	64,350	30,496	127,766	127,766	22,445	133.3%	133.3%	
23	Creación de nuevos emprendimientos e iniciativas	0	833	0	833	0	0	0	0	2,500	0%	0%	
24	Rincón de calaveras	0	833	0	833	0	0	0	0	2,500	0%	0%	
25	Rincón de calaveras	0	8,415	8,415	8,415	0	0	0	0	25,246	0%	0%	
29	Festiva del maizchilo	120,104	172,292	160,964	172,292	226,108	172,292	507,176	507,176	1,249,587	79.4%	79.4%	
33	Promoción del Desarrollo Económico	0	4,167	0	4,167	40,600	4,167	40,600	40,600	75,000	108.3%	108.3%	
35	Programa de desarrollo urbano	0	20,323	0	20,323	0	0	0	0	25,000	0%	0%	
36	Programa mejoramiento genético bovino	0	20,323	0	20,323	0	0	0	0	25,000	0%	0%	
38	Fomento al uso de semilla mejorada de maíz y frijol temporal en el municipio	0	2,917	0	2,917	18,600	2,917	18,600	18,600	247,650	133.3%	133.3%	
41	Modernización de la infraestructura de la presa el cauillo parte 2	0	20,833	0	20,833	0	0	0	0	62,500	0%	0%	
42	Rehabilitación de caminos saca cosecha	78,645	81,489	87,167	81,489	133,810	81,489	308,622	308,622	871,614	37.963	133.3%	
44	Modernización de fuentes de agua de consumo humano y riego	2,770,185	2,625,972	2,573,169	2,625,972	2,525,174	2,625,972	7,370,593	7,370,593	21,026,488	25.112.131	85.3%	
45	Protección civil y bomberos	51,308	167,181	158,800	167,181	186,869	167,181	178,105	178,105	1,381,932	1,281,951	101.6%	
46	Fuentes salinas	0	-239,791	0	-239,791	176,185	-239,791	176,185	-239,791	-239,791	0	0%	
47	Municipio incluyente y garante de los derechos humanos	605,091	647,088	675,803	647,088	1,212,514	647,088	2,403,408	2,403,408	5,805,878	5,805,878	100.5%	
48	Equidad de Género, Niños Niñas y Adolescentes	58,328	56,196	56,196	56,196	102,991	56,196	215,448	215,448	540,120	100.5%	100.5%	
49	Seguridad Jurídica Municipal	0	833,711	0	833,711	1,966,147	833,711	3,004,424	3,004,424	6,142,040	5,712,633	107.5%	
50	Modernización de los Servicios Públicos	2,031,746	3,028,705	2,688,144	3,028,705	2,618,390	3,028,705	7,062,392	7,062,392	28,424,573	98.9%	98.9%	
52	OOPAS	300,000	333,333	308,366	333,333	0	333,333	608,366	608,366	1,568,396	3,000,000	48.8%	
55	Proyectos de inversión pública, Fondo Rescate Museo del Sembl 2da	0	20,500	0	20,500	0	0	0	0	61,500	0%	0%	
56	Obras públicas desarrollo administrativo	476,902	458,333	680,652	458,333	1,610,842	458,333	1,610,842	1,610,842	4,099,608	4,057,402	100.8%	
57	Planificación Municipal de planeación integral	20,002	15,583	23,002	15,583	55,353	15,583	63,818	63,818	2,149,500	2,149,500	64.9%	
58	Control del desarrollo urbano	271,402	291,335	275,769	291,335	381,711	291,335	638,012	638,012	1,540,320	2,137,250	30.7%	
59	Medio ambiente y Crea de Malanza	3,610	8,593	23,655	8,593	31,359	8,593	59,000	59,000	54,420	337,500	60.6%	
60	Coordinación actividades	22,600	31,667	22,600	31,667	48,327	31,667	93,527	93,527	300,330	337,500	60.6%	
61	Fortalecimiento de las finanzas municipales	484,034	844,276	733,435	844,276	892,716	844,276	2,086,185	2,086,185	6,628,041	7,048,227	122.4%	
64	Oceano administrativa	798,080	659,414	699,334	659,414	2,169,434	659,414	2,169,434	2,169,434	1,831,440	9,201,352	79.9%	
65	Informe de Gobierno	1,609,836	1,609,833	1,571,940	1,609,833	4,669,343	5,097,500	13,854,815	13,854,815	13,867,500	100.6%	100.6%	
67	Seguridad Social	208,333	125,912	208,333	125,912	305,740	625,000	625,000	625,000	1,875,000	1,875,000	16.3%	
68	Comedor Comunitario	7,441	12,500	9,587	12,500	11,518	12,500	37,500	37,500	61,543	112,500	54.7%	
70	Equivalente	89,264	44,768	87,500	44,768	178,269	265,500	463,610	463,610	337,500	148.3%	148.3%	
71	Exoneración	0	9,100	28,396	9,100	9,100	34,396	71,250	71,250	141,636	71,250	62.3%	
72	Consolidación de techumbre en el CEYTEA	0	5,003	0	5,003	0	0	0	0	15,010	0%	0%	
73	Rehabilitación de red o sistema de agua potable en el Rincon de Romeros	0	21,748	0	21,748	235,701	65,243	235,701	235,701	65,243	391.3%	120.4%	
74	Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincon de Romeros localidad la Boquilla	0	24,726	0	24,726	219,420	74,177	219,420	219,420	74,177	295.6%	99.6%	
75	Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincon de Romeros localidad la Boquilla calle General Lazaro Cardenas	0	37,500	0	37,500	0	0	0	0	112,500	0%	0%	
76	Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincon de Romeros localidad la Boquilla calle Bicentenario	0	25,000	0	25,000	0	0	0	0	75,000	0%	0%	
77	Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincon de Romeros localidad Rincon de Romeros asentamiento magisterial calle 16 de septiembre tramos entre Dr. Guaf Jimenez y 20 de Noviembre y Municipio Libre a Francisco Villa	279,480	39,149	190,308	39,149	469,769	117,447	469,769	469,769	352,941	400.0%	133.3%	
78	Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincon de Romeros localidad Rincon de Romeros asentamiento magisterial calle 16 de septiembre tramos entre calle general Lazaro Cardenas	395,007	36,530	159,348	36,530	462,354	115,501	462,354	462,354	348,773	348.773	133.3%	
79	Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincon de Romeros localidad la Boquilla calle Bicentenario	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	150,000	0%	0%	
80	Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincon de Romeros localidad la Boquilla calle Bicentenario	0	29,167	0	29,167	0	0	0	0	87,500	0%	0%	

C. LAURA BELEN-MICHAEL ANTONIA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

LIC. J. JESUS ALFONSO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-10CAD

Clave	Entre Fiscalizado	Municipio de Romos	Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021	96,185	986,818	96,185	986,818	288,656	342.0%	986,818	865,669	114.0%
Periodo												
81	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico calle Delfino V Anayo, entre calles Alvaro Obregón y Juan Diego, en Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento barrio de Guadalupe, Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos, calle 15 de Septiembre entre calle Dr. Durazno Quid Jimenez y Av 20 de Noviembre en Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Santa Anita	0	96,185	0	986,818	96,185	986,818	288,656	342.0%	986,818	865,669	114.0%
82	Rehabilitación de Pavimento a base de concreto hidráulico calle 16 De Septiembre entre calle Municipio Libre y Francisco Villa en Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Magdalena	0	69,096	0	298,785	69,096	298,785	207,287	144.1%	298,785	621,961	49.0%
83	Rehabilitación de Pavimento a base de concreto hidráulico en Rincon de Romos, localidad Mir Negrá calle Mir Negrá	0	57,451	0	57,451	57,451	0	172,352	0.0%	0	517,056	0.0%
84	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Rincon de Romos, localidad Mir Negrá calle Mir Negrá	0	50,949	0	50,949	50,949	0	152,646	0.0%	0	456,537	0.0%
85	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Rincon de Romos, localidad Mir Negrá calle Mir Negrá (Lateral lado Norte del Templo)	0	45,570	0	45,570	45,570	0	138,709	0.0%	0	410,126	0.0%
86	Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Colonia San Jose calle Plutarco Elias Calles	0	65,700	0	65,700	65,700	0	197,099	0.0%	0	591,298	0.0%
88	Rehabilitación de pavimento en Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Magdalena calle lateral Morelos Sur	0	20,833	0	20,833	20,833	0	62,500	0.0%	0	187,500	0.0%
89	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento colonia Constitución, calle Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	73,025	109,118	427,406	892,202	109,118	1,302,634	327,354	397.9%	1,302,634	982,003	132.6%
91	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Colonia calle Valentín Gómez Farías	0	109,345	0	414,363	109,345	414,363	328,036	126.3%	414,363	984,108	42.1%
92	Hidalgó asentamiento Constitución calle Francisco Zarco entre calle Venustiano Carranza y Fray Servando Teresa de Mier	0	49,330	0	433,597	49,330	433,597	147,991	293.0%	433,597	443,972	97.7%
93	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento colonia Constitución calle Fray Servando Teresa de Mier	0	86,392	42,537	526,057	86,392	568,594	259,176	219.4%	568,594	777,528	73.1%
94	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento colonia Hctor Hugo Olivares calle 20 de Noviembre	0	126,679	64,083	126,679	126,679	64,083	380,656	16.8%	64,083	1,141,809	6.6%
95	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento colonia Hctor Hugo Olivares, calle 24 de Febrero	0	113,514	63,827	113,514	113,514	1,008,560	340,643	296.2%	1,008,560	1,021,930	98.7%
96	Natura calle Porfirio Díaz	0	120,487	0	120,487	120,487	0	1,084,380	0.0%	0	1,084,380	0.0%
97	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad California calle Fray Servando Teresa de Mier	0	83,962	0	83,962	83,962	0	251,986	0.0%	0	755,658	0.0%
98	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad El Bajío asentamiento El Bajío calle Guerrero entre Guerrero y Libertad	120,291	112,210	974,331	144,643	112,210	1,239,295	338,629	368.1%	1,239,295	1,009,888	122.7%
99	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad El Bajío asentamiento El Bajío calle Guerrero entre Guerrero y Victoria	0	77,964	63,447	77,964	63,447	63,447	232,953	27.3%	63,447	698,079	9.1%
A1	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad La Boquilla calle Constitución	0	133,333	0	133,333	133,333	0	370,000	0.0%	0	1,110,000	0.0%
A2	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad La Boquilla calle Bicentenario	0	58,333	0	58,333	58,333	0	175,000	0.0%	0	525,000	0.0%
A3	Construcción de pavimentación primera etapa en Rincon de Romos, localidad San Jacinto asentamiento San Jacinto Avenida Zetateñas	246,329	127,041	1,149,696	97,977	127,041	1,494,003	381,123	392.0%	1,494,003	1,143,369	130.7%
A4	Construcción de pavimentación en Rincon de Romos, localidad Valle de las Delicias calle Aquilán Melgar	0	121,303	1,288,786	127,742	121,303	1,426,528	363,998	392.0%	1,426,528	1,091,725	130.7%
A5	Rehabilitación de unidades deportivas públicas en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Pabellón de Hidalgo (acceso y juegos infantiles)	0	14,115	0	14,115	14,115	0	42,344	0.0%	0	344,054	0.0%
A6	Rehabilitación de unidades deportivas públicas en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Pabellón de Hidalgo (acceso y juegos infantiles)	0	130,436	0	130,436	130,436	0	391,308	0.0%	0	1,091,730	0.0%
A7	Construcción de Techarios en espacios multideportivos y bienes Públicos. En Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Solidaridad foro al Pabellón de Hidalgo asentamiento Pabellón de Hidalgo (rechumbre)	0	120,000	0	120,000	120,000	0	387,000	0.0%	0	1,181,000	0.0%
A8	Construcción de Techarios en espacios multideportivos y bienes Públicos. En Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Solidaridad foro al Pabellón de Hidalgo asentamiento Pabellón de Hidalgo (rechumbre)	0	625,000	0	625,000	625,000	0	1,875,000	0.0%	0	4,875,000	0.0%
A9	Construcción de Techarios en espacios multideportivos y bienes Públicos. En Rincon de Romos, localidad Rincon de Romos asentamiento Solidaridad foro al Pabellón de Hidalgo asentamiento Pabellón de Hidalgo (rechumbre)	0	275,000	0	275,000	275,000	0	825,000	0.0%	0	2,175,000	0.0%
B1	Coladores solares	0	65,667	0	65,667	65,667	1,173,844	27,000	495.7%	1,173,844	862,000	133.1%
B2	Castos indirecto para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos	0	56,883	0	56,883	56,883	185,600	170,649	108.8%	185,600	511,948	36.3%
B3	Reubicación y adecuación de la Comedia eléctrica en Presidencia	320,727	41,667	178,357	0	41,667	498,985	125,000	399.2%	498,985	375,000	133.1%
B4	Reparación del Primer Tramo de pavimento de Canal en Morelos y México	0	29,500	0	29,500	29,500	0	88,500	0.0%	0	285,500	0.0%
B5	Construcción de Pavimento 1ra. Etapa de calle Penamé, Santa Cruz	0	166,000	0	166,000	166,000	0	498,000	0.0%	0	675,000	0.0%
B6	Rehabilitación del o sistema de agua entubada acceso a servicios básicos de la vivienda en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Constitución calle Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	0	42,326	0	42,326	157,095	42,326	126,679	123.7%	157,095	126,679	123.7%
B7	Rehabilitación del o sistema de agua entubada acceso a servicios básicos de la vivienda en Rincon de Romos, localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Constitución calle Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	0	28,015	0	28,015	111,925	28,015	84,046	133.2%	111,925	84,046	133.2%

M. J. LESOS PRENETO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BEERRA DE CALDERONA EL ZONDO
SECRETARIA MUNICIPAL

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

RAGF-IUCAD

Clave	Período	Municipio de Rincón de Romos									
		Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021									
B8	0	33,491	0	33,491	0	33,491	0	100,474	0	100,474	0.0%
B9	0	24,736	0	24,736	96,475	24,736	96,475	74,207	96,475	74,207	130.0%
C1	0	62,343	0	62,343	247,972	62,343	247,972	187,030	247,972	187,030	132.6%
C2	0	34,485	0	34,485	120,862	34,485	120,862	103,455	120,862	103,455	116.9%
C3	0	85,110	0	85,110	0	85,110	0	249,331	0	249,331	0.0%
C4	0	44,893.65	0	44,893.65	177,769	44,893.65	177,769	134,891	177,769	134,891	131.8%
TOTAL	0	14,261,544	0	14,261,544	18,543,393	18,832,246	25,143,393	69,676,737	143,721,570	176,346,367	97.4%

Rehabilitación de red o sistema de agua entubada acceso a servicios básicos de la vivienda en Rincón de Romos localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hektor Hujo Olivos calle 20 de Noviembre

Rehabilitación de red o sistema de agua entubada acceso a servicios básicos de la vivienda en Rincón de Romos localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hektor Hujo Olivos calle 24 de Febrero

Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincón de Romos localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hektor Hujo Olivos calle Francisco Zarco entre calle Fray Servando Terán y calle Francisco Zarco entre calle Francisco Zarco y calle Fray Servando Terán de Mar y Veracruzano Carrizal

Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincón de Romos localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hektor Hujo Olivos Saritama calle 20 de Noviembre

Rehabilitación de drenaje sanitario en Rincón de Romos localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hektor Hujo Olivos Saritama calle 24 de Febrero

[Handwritten signature]

L.C. JESÚS PRIETO GÁZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. LAURA BEJERRE DE ROSA ELIZONDO
SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C. CLARA TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 12

07P

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Clave _____
 Ente Fiscalizado Municipio de Rincón de Romos
 Periodo Del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	189,329,663
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,345,587
DIFERENCIA	18,984,076

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Tercer Trimestre se registra una diferencia entre lo real acumulado con el programado a septiembre del 2021 esto debido a las diferentes estrategias de recaudación que se implementaron en el área de ingresos, así como a la recuperación en tiempo y forma del Impuesto sobre la Renta Participable.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	143,721,570
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,345,587
DIFERENCIA	(26,624,016)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Tercer Trimestre el gasto se ha realizado con racionalidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS el cual a la fecha se encuentran algunas obras en el proceso de adjudicación las cuales se verán reflejadas en el siguiente trimestre.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	143,721,570
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	170,345,587
DIFERENCIA	(26,624,016)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Al cierre del Tercer Trimestre el gasto se ha realizado con racionalidad y eficiencia, la diferencia se debe al recurso Federal denominado FIMS el cual a la fecha se encuentran algunas obras en el proceso de adjudicación las cuales se verán reflejadas en el siguiente trimestre.

LIC. J. JESUS PRIETO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERENICE CASTORENA ELIZONDO
 SINDICA MUNICIPAL

L.C. CLARA TORRES REYES
 TESORERA MUNICIPAL

ANEXO 13

HP

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Julio - Septiembre
2021
Periodo:

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2021		Avance		
							Relativo	Realizado	Programado	% de avance Presupuesto VS Periodo	
Compensación y rutas de ciclismo	Presupuesto asignado al programa "Compensación y rutas de ciclismo"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Compensación y rutas de ciclismo"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$56,485.00	\$29,680.00	46.10%	133.32%
Creación de escuelas deportivas	Presupuesto asignado al programa "Creación de escuelas deportivas"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Creación de escuelas deportivas"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$2,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Ligas deportivas	Presupuesto asignado al programa "Ligas deportivas"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Ligas deportivas"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$7,500.00	\$16,153.79	214.38%	79.60%
Desarrollo cultural y artístico	Presupuesto asignado al programa "Desarrollo cultural y artístico"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Desarrollo cultural y artístico"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$5,648,073.98	\$2,305,340.44	125.70%	100.45%
Día del sector público y privado	Presupuesto asignado al programa "Día del sector público y privado"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Día del sector público y privado"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$7,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Fundación del Municipio	Presupuesto asignado al programa "Fundación del Municipio"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Fundación del Municipio"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$44,727.79	\$0.00	0.00%	133.33%
Atracción a grupos de atención a grupos en situación de vulnerabilidad	Presupuesto asignado al programa "Atracción a grupos en situación de vulnerabilidad"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Atracción a grupos en situación de vulnerabilidad"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$3,706,802.83	\$1,207,268.83	116.47%	100.45%
Bienestar de la persona y de la familia	Presupuesto asignado al programa "Bienestar de la persona y de la familia"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Bienestar de la persona y de la familia"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$1,031,168.17	\$564,658.17	106.42%	61.80%
Día de la familia	Presupuesto asignado al programa "Día de la familia"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Día de la familia"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$69,452.02	\$0.00	0.00%	133.33%
Día del adulto	Presupuesto asignado al programa "Día del adulto"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Día del adulto"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$12,500.00	\$3,500.00	36.00%	131.00%
Día Navideña	Presupuesto asignado al programa "Día Navideña"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Día Navideña"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$12,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Talleres	Presupuesto asignado al programa "Talleres"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Talleres"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$162,760.00	\$97,790.00	109.82%	114.19%
Salud Pública	Presupuesto asignado al programa "Salud Pública"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Salud Pública"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$1,647,234.19	\$339,834.19	103.00%	111.64%
Atención y participación ciudadana	Presupuesto asignado al programa "Atención y participación ciudadana"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Atención y participación ciudadana"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$3,368,937.20	\$1,269,028.66	80.61%	68.40%
Participación ciudadana	Presupuesto asignado al programa "Participación ciudadana"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Participación ciudadana"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$4,250,215.50	\$1,437,497.49	84.01%	82.31%
Taller joven	Presupuesto asignado al programa "Taller joven"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Taller joven"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$33,000.00	\$11,000.00	129.74%	61.10%
Desarrollo integral de la juventud	Presupuesto asignado al programa "Desarrollo integral de la juventud"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Desarrollo integral de la juventud"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$384,226.75	\$41,489.75	139.00%	86.27%
Capacitación de nuevos empresarios	Presupuesto asignado al programa "Capacitación de nuevos empresarios"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Capacitación de nuevos empresarios"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$22,444.50	\$0.00	0.00%	133.33%
Rincón de cívicos	Presupuesto asignado al programa "Rincón de cívicos"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Rincón de cívicos"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$7,500.00	\$2,500.00	0.00%	0.00%
Rincón navideño	Presupuesto asignado al programa "Rincón navideño"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Rincón navideño"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$7,500.00	\$2,500.00	0.00%	0.00%
Festival del marabú	Presupuesto asignado al programa "Festival del marabú"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Festival del marabú"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$15,245.73	\$0.00	0.00%	133.33%
Promoción del desarrollo económico	Presupuesto asignado al programa "Promoción del desarrollo económico"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Promoción del desarrollo económico"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$1,573,735.90	\$616,875.50	68.12%	79.40%
Programa de equipamiento rural agrícola	Presupuesto asignado al programa "Programa de equipamiento rural agrícola"	Empresa el presupuesto asignado al programa "Programa de equipamiento rural agrícola"	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto total) x 100	Gestión	Eficiencia	Relativo	100.00%	\$37,000.00	\$12,500.00	324.86%	108.27%

L.C. CLARA TORRES NEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA BERNARDINO LOPEZ ELIZONDO
SECRETARIA MUNICIPAL

L.C. CLARA TORRES NEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS



Periodo: Julio - Septiembre 2021

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2021		Avance		
							Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado vs Anual	
Programa mejoramiento genético bovino	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$75,000.00	\$25,000.00	\$0.00	0.00%	
Fomento al uso de semillas mejoradas	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
Fomento al uso de maquinaria agrícola	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$29,750.00	\$8,750.00	\$16,000.00	\$16,000.00	212.5%
Modernización de la infraestructura de la zona rural	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$127,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Rehabilitación de caminos rurales	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$37,500.00	\$12,500.00	\$25,000.00	\$25,000.00	133.33%
Coordinación de los servicios de salud	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$70,000.00	\$24,400.00	\$30,000.00	\$30,000.00	124.2%
Modernización de la agricultura	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$25,112,130.75	\$7,716,934.75	\$7,730,503.20	\$7,730,503.20	103.14%
Protección civil	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,391,561.00	\$1,101,561.00	\$07,507.50	\$07,507.50	0.6%
Prestos públicos	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$135,000.00	\$719,374.00	\$78,184.50	\$78,184.50	24.77%
Municipio incluyente	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$5,383,555.83	\$1,845,054.83	\$2,483,408.07	\$2,483,408.07	128.26%
Equidad de Género	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$540,180.25	\$168,986.75	\$215,448.30	\$215,448.30	107.60%
Calidad abierta	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$5,712,932.78	\$2,471,132.78	\$3,004,423.01	\$3,004,423.01	101.56%
Seguridad Municipal	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$80,000.00	\$29,230.00	\$42,296.10	\$42,296.10	148.56%
Modernización de los Servicios Públicos	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$26,425,572.58	\$10,886,115.18	\$7,246,184.22	\$7,246,184.22	66.50%
Descargas de Aguas Residuales	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,687,000.00	\$802,500.00	\$800,100.00	\$800,100.00	104.18%
ODOPAS	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$3,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyectos de inversión pública	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Obra pública	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$4,687,402.24	\$1,403,137.74	\$1,610,842.05	\$1,610,842.05	114.80%
Planificación integral	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$752,250.00	\$48,750.00	\$68,367.47	\$68,367.47	210.36%
Control del desarrollo urbano	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$2,905,561.27	\$874,005.77	\$638,912.86	\$638,912.86	107.43%
Medio ambiente	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$137,250.00	\$25,750.00	\$31,369.32	\$31,369.32	121.79%
Coordinación	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$337,500.00	-\$95,000.00	\$63,527.10	\$63,527.10	-94.45%
Fortalecimiento de las finanzas municipales	Presupuesto asignado al programa	Ejecución del presupuesto asignado al programa	(Presupuesto programado) / (Presupuesto asignado) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$7,846,208.53	\$3,523,826.83	\$3,586,165.32	\$3,586,165.32	80.13%

L.C. LAIRA TORRES REYES
SECRETARÍA MUNICIPAL

L.C. LAIRA TORRES REYES
SECRETARÍA MUNICIPAL

L.C. JESÚS PIÑEIRO DÍAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Período: Julio - Septiembre 2021

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2021		Avance				
							Abierto	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS	Período Anual	
Gobierno transparente	Presupuesto asignado al programa Gobierno transparente	Ejecución del presupuesto asignado al programa Gobierno transparente	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$1,831,438.96	100.00%	\$724,302.56	\$724,302.56	104.12%	91.80%	
Operación Administrativa	Presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	Ejecución del presupuesto asignado al programa Operación Administrativa	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$9,201,382.30	100.00%	\$2,878,243.91	\$2,878,243.91	01.00%	79.60%	
Informe de Gobierno	Presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	Ejecución del presupuesto asignado al programa Informe de Gobierno	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$160,000.00	100.00%	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%	100.00%	132.72%
Seguridad Social	Presupuesto asignado al programa Seguridad Social	Ejecución del presupuesto asignado al programa Seguridad Social	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$13,687,500.00	100.00%	\$5,687,500.00	\$4,680,343.34	92.31%	99.77%	
Obras Públicas Participaciones	Presupuesto asignado al programa Obras Públicas Participaciones	Ejecución del presupuesto asignado al programa Obras Públicas Participaciones	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$1,875,000.00	100.00%	\$203,000.00	\$305,700.04	48.02%	19.31%	
Comedor Comunitario	Presupuesto asignado al programa Comedor Comunitario	Ejecución del presupuesto asignado al programa Comedor Comunitario	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$112,500.00	100.00%	\$37,500.00	\$28,548.05	78.12%	54.71%	
Medidas de Prevención contra el COVID-19	Presupuesto asignado al programa Medidas de Prevención contra el COVID-19	Ejecución del presupuesto asignado al programa Medidas de Prevención contra el COVID-19	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$337,500.00	100.00%	\$292,500.00	\$178,208.80	97.01%	148.25%	
Equinoterapia	Presupuesto asignado al programa Equinoterapia	Ejecución del presupuesto asignado al programa Equinoterapia	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$71,250.00	100.00%	\$23,750.00	\$34,300.00	144.82%	62.31%	
Consolidación de Convenio IEA-MPO	Presupuesto asignado al programa Consolidación de Convenio IEA-MPO	Ejecución del presupuesto asignado al programa Consolidación de Convenio IEA-MPO	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$81,898.31	100.00%	\$27,299.44	\$0.00	0.00%	0.00%	
Consolidación de Convenio de Incentivos en BICESTEL	Presupuesto asignado al programa Consolidación de Convenio de Incentivos en BICESTEL	Ejecución del presupuesto asignado al programa Consolidación de Convenio de Incentivos en BICESTEL	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$45,031.40	100.00%	\$15,010.47	\$0.00	0.00%	133.33%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$195,109.21	100.00%	\$95,243.07	\$235,700.59	381.27%	120.42%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$222,581.91	100.00%	\$74,177.17	\$219,420.22	298.91%	98.80%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$327,500.00	100.00%	\$112,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$225,000.00	100.00%	\$75,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$352,341.38	100.00%	\$117,447.13	\$499,788.51	400.00%	133.33%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$349,773.49	100.00%	\$115,591.16	\$492,354.42	309.60%	133.33%	
Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	Ejecución del presupuesto asignado al programa Rehabilitación de red o sistema de agua potable en Rincón de Romos	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)x100	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$450,000.00	100.00%	\$150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

L.C. LAURA TORRES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LUIS ALBERTO OJEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LAURA TORRES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
INDICADORES ESTRATEGICOS

Periodo: Julio - Septiembre 2021

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2021		Avance			
							Asesorio	Relativo	Programado	Realizado	% de Avance Realizado VS Período Anual	
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad La Boquilla calle Bencinaro	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad La Boquilla calle Bencinaro	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad La Boquilla calle Bencinaro	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$202,500.00	100.00%	\$27,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$665,968.93	100.00%	\$236,556.31	\$208,818.16	341.08%	113.05%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$521,603.89	100.00%	\$207,266.96	\$206,795.28	144.14%	48.05%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$517,093.33	100.00%	\$172,362.11	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$48,598.97	100.00%	\$102,848.62	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$410,128.21	100.00%	\$136,708.74	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$581,267.56	100.00%	\$107,066.19	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$187,500.00	200.00%	\$92,500.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$562,062.69	100.00%	\$27,354.22	\$1,302,033.54	307.63%	132.64%
Rehabilitación de pavimento a base de concreto hidráulico en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	Expresa el presupuesto asignado al programa de rehabilitación de drenaje sanitario en el Rincón de Romos localidad de asentamiento barrio de Guadalupe	(Presupuesto programado)/(Presupuesto o devengado)*100	Gestión	Ejecuta	Relativo	\$661,108.40	100.00%	\$293,096.13	\$414,392.01	120.32%	42.11%

L.C. CLARA TORRES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUARA REYES TORRES REYES
SECRETARIA MUNICIPAL

L.C. J. ROSARIO RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

INDICADORES ESTRATÉGICOS



Informe de Avance de Gestión Financiera
 Julio - Diciembre 2021

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2021		Avance			
							Atsokete	Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS Período	Anual
Construcción de pavimentación en la localidad de Hidalgo	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Hidalgo	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Hidalgo	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$443,971.65	100.00%	\$147,990.55	\$33,990.00	262.00%	87.80%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$777,527.95	100.00%	\$294,175.98	\$68,884.05	218.30%	73.13%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,141,969.30	100.00%	\$380,030.50	\$49,082.04	10.84%	5.61%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,021,020.01	100.00%	\$340,543.20	\$1,008,556.64	290.10%	68.72%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,084,300.30	100.00%	\$291,400.13	\$0.00	0.00%	0.00%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$788,698.13	100.00%	\$251,886.04	\$0.00	0.00%	0.00%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,009,888.27	100.00%	\$336,809.49	\$1,239,205.24	308.14%	122.71%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$68,078.65	100.00%	\$22,692.98	\$83,447.27	27.27%	9.00%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,110,000.00	100.00%	\$370,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$525,000.00	100.00%	\$175,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,143,269.40	100.00%	\$381,123.13	\$1,484,602.52	300.00%	130.67%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$1,091,725.32	100.00%	\$393,808.44	\$1,428,527.02	300.00%	130.67%
Construcción de pavimentación en la localidad de Remedios	Presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	Ejecución del presupuesto asignado al programa de pavimentación en la localidad de Remedios	(Presupuesto asignado al programa) / (Presupuesto asignado al programa) x 100	Gestión	Ejecución	Relativo	\$344,020.73	100.00%	\$42,343.74	\$0.00	0.00%	0.00%

[Handwritten signature]
 L.C. CLARA TORRES REYES
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C. LAURA BERNABÉ OJEDA ELIZONDO
 SINDICATO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. J. JUAN PIQUERO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
INDICADORES ESTADÍSTICOS



Periodo: Julio - Septiembre 2021

Programa	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta 2021		Avance		
							Relativo	Programado	Realizado	% de avance Realizado VS Meta Anual	
Rehabilitación de red sistema de agua en servicios básicos de la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Presupuesto asignado para la rehabilitación de red sistema de agua en servicios básicos de la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Empresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de red sistema de agua en servicios básicos de la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Presupuesto asignado para la rehabilitación de red sistema de agua en servicios básicos de la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Costeo	Eficiencia	Relativo	\$100.474,30	\$100.474,30	\$0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación de sistema de agua entubada acceso a la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de red sistema de agua entubada acceso a la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Empresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de red sistema de agua entubada acceso a la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de red sistema de agua entubada acceso a la vivienda en Rincón de Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$74.200,04	\$74.200,04	\$96.476,47	130,01%	130,01%
Rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Empresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$187.030,40	\$187.030,40	\$242.071,00	129,39%	132,66%
Rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Empresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Francisco Zarco entre Fray Servando Teresa de Mier y Francisco I. Madero	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$103.455,13	\$103.455,13	\$120.882,04	116,84%	116,84%
Rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Empresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 20 de Noviembre	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$240.231,48	\$240.231,48	\$0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Empresa el presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Presupuesto asignado para la rehabilitación de drenaje sanitario en localidad Pabellón de Hidalgo asentamiento Hector Olivares calle 24 de Febrero	Gestión	Eficiencia	Relativo	\$134.820,04	\$134.820,04	\$177.786,59	131,85%	131,85%

[Handwritten signature]

LIC. JESÚS PRIETO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. LAURA BERNARDO LORENA ELUENGO
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C. CARMEN TORRES REYES
TESORERA MUNICIPAL
